



# Sítio Tunga

## Avenida Léa Pompeu

### Resumo fotográfico dos serviços

#### **SEMANA 18: 29/01 A 02/02/2018**

- ❖ Diário de Obra, (slide 02 ao 06).
- ❖ Execução da Primeira camada de asfalto na Rua Laranjal do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu,(slide 07).
- ❖ Execução da Primeira camada de asfalto do lado direito no encontro da Rua Laranjal com a Avenida Léa Pompeu,(slide 08).
- ❖ Imprimação da Rua Maria Alice Ferraz com Avenida Léa Pompeu do lado direito,(slide 09).
- ❖ Execução da primeira camada de asfalto do lado direito no encontro da Avenida Léa Pompeu com Rua Maria Alice Ferraz,(slide 10).
- ❖ Execução da compactação de material na calçada da estaca 03 a 09 do lado direito da Avenida Léa Pompeu,(slide 11).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 03 a 07 do lado direito da Avenida Léa Pompeu,(slide 12)
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 09 a 12 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu,(slide 13).
- ❖ Execução da rede de esgoto na calçada da estaca 13 a 29 do lado direito da Avenida Léa Pompeu,(slide 14).

# 1. DIÁRIO DE OBRA

2

## SEMANA 18: 1º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			JANEIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		29	30	31	01	02	03	04
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de meio-fio da rua Laranjal lado direito. Execução da primeira camada de asfalto da laranjal lado esquerdo.						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	01							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	01									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>04</b>							


# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 18: 2º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 				MÊS:		JANEIRO/2018				
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		29	30	31	01	02	03	04
				Nº		14				
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de asfalto na Av. Léa Pompeu da estaca 0 a 2.						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>		Execução de meio-fio interno e externo da Rua Laranjal.						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	01							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	00							
Motorista	00	Pipa	01							
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	01									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>17</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>04</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA


## SEMANA 18: 3º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			JANEIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		29	30	31	01	02	03	04
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de asfalto na Av. Léa Pompeu da estaca 28 a 33 com a rua Maria Alice Ferraz.						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>		Execução de meio-fio na Av. Léa Pompeu lado direito da estaca 35 a 32 com a Rua Maria Alice Ferraz.						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00	Execução da rede de esgoto da estaca 13 a 29 com os pv na Av. Léa Pompeu.						
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	02							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	01	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02							
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02							
Pedreiro	01									
Servente	07									
Topógrafo	02									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA

5

## SEMANA 18: 4º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	29	30	31	01	02	03	04
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)	Início da execução dos blocos intertravados na calçada da estaca 03 a 07 lado direito da Av. Léa pompeu.						
Administrativo	01 Caminhão Basculante							
Aux. Topografia	02 Motoniveladora							
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica							
Encarregado	01 Trator de Esteira							
Ficheiro	01 Carro Manutenção							
Motorista	00 Pipa							
Op. de Rolo	01 Compactador Liso Dinapac							
Op. Escavadeira	01 Pálio							
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira							
Op. Patrol	01 Rolo pé carneiro							
Op. Trator de Esteira	01 S-10							
Op. Trator de Pneus	02 Trator de pneus							
Pedreiro	01							
Servente	07							
Topógrafo	02							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>					

**MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS**

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 18: 5º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		29	30	31	01	02	03	04
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Início da execução dos blocos intertravados na calçada da estaca 09 a 12 lado esquerdo da Av. Léa pompeu.						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	01							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	01							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	01									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>08</b>							

**Figura 01 e 02.** Execução da Primeira camada de asfalto na Rua Laranjal do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 01.**



**Figura 02.**

**Figura 03 e 04.** Execução da Primeira camada de asfalto do lado direito no encontro da Rua Laranjal com a Avenida Léa Pompeu.



**Figura 03.**



**Figura 04.**



**Figura 05 e 06.** Imprimação da Rua Maria Alice Ferraz com Avenida Léa Pompeu do lado direito.



**Figura 05.**



**Figura 06.**

**Figura 07 e 08.** Execução da primeira camada de asfalto do lado direito no encontro da Avenida Léa Pompeu com Rua Maria Alice Ferraz.



**Figura 07.**



**Figura 08.**

**Figura 09 e 10.** Execução da compactação do material na calçada da estaca 03 a 09 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 09.**




**Figura 10.**

**Figura 11 e 12.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 03 a 07 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 11.**

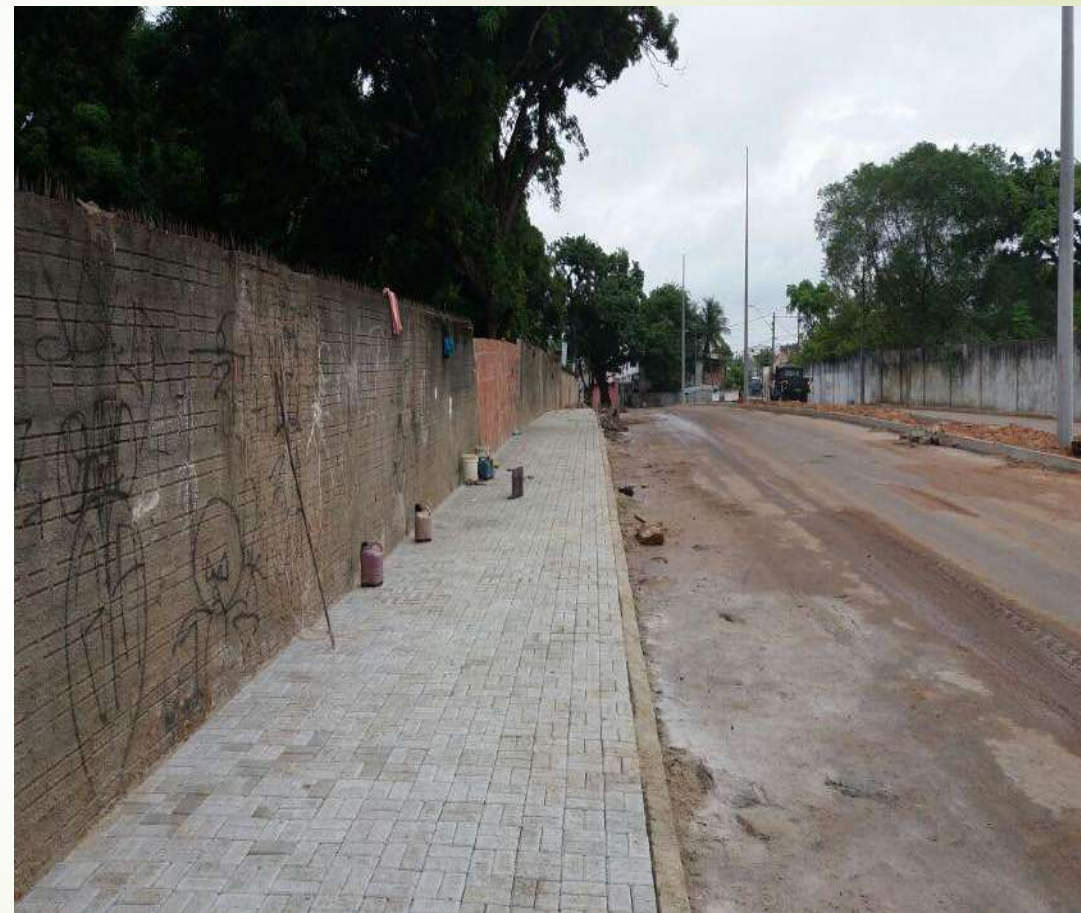

**Figura 12.**

**Figura 13.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 09 a 12 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 13.**

14

**Figura 14 e 15.** Execução da rede de esgoto na calçada da estaca 13 a 29 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 14.**



**Figura 15.**



# Sítio Tunga

## Avenida Léa Pompeu

### Resumo fotográfico dos serviços

#### **SEMANA 19: 05/02 A 09/02/2018**

- ❖ Diário de Obra, (slide 02 ao 06).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 08 a 10 do lado direito da Avenida Léa Pompeu, (slide 07).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 06 a 09 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu, (slide 08).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 12 a 14 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu, (slide 09).
- ❖ Conclusão do meio-fio do lado direito da Rua Laranjal, (slide 10).
- ❖ Conclusão do meio-fio do lado esquerdo da Rua Maria Alice Ferraz, (slide 11).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 11 a 15 do lado direito da Avenida Léa Pompeu, (slide 12).
- ❖ Execução de reforço com envelopamento dos tubos na rede de esgoto da estaca 21 a 23 do lado direito da Avenida Léa Pompeu, (slide 13).

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 1º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	05	06	07	08	09	10	11
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>		<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)	Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 08 a 10 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.						
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	01 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	01 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	01						
Op. de Rolo	01 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00						
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	01 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	01							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>04</b>					

**MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEICULOS**




# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 2º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	05	06	07	08	09	10	11
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 06 a 09 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.					
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01					
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	00					
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00					
Encarregado	01	Trator de Esteira	00					
Ficheiro	01	Carro Manutenção	00					
Motorista	00	Pipa	00					
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00					
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>				
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00					
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00					
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01					
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00					
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	01							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>17</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>02</b>					

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 3º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	05	06	07	08	09	10	11
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>							
(Conforme necessidade)	(Conforme necessidade)		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 12 a 14 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.					
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00	Finalizando a escavação do esgoto da estaca 25+10 a 29.				
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02	Falta definir o envelopamento da rede de esgoto de 93 metros.				
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01					
Encarregado	01	Trator de Esteira	01					
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01					
Motorista	00	Pipa	02					
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01					
Op. Escavadeira	01	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>				
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00					
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02					
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01					
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02					
Pedreiro	01							
Servente	07							
Topógrafo	02							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>					

# 1. DIÁRIO DE OBRA

5

## SEMANA 19: 4º dia de trabalho no Sítio Tunga


DIÁRIO DE OBRA 		MÊS: FEVEREIRO/2018						
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	05	06	07	08	09	10	11
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº					14	
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)			Início do envelopamento da rede de esgoto na calçada do lado direito da Av, Léa Pompeu. Concluindo a parte do Meio-fio do lado direito da Rua Laranjal. Execução concluída de meio-fio do lado esquerdo da Rua Maria Alice Ferraz.				
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00					
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02					
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01					
Encarregado	01	Trator de Esteira	01					
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01					
Motorista	00	Pipa	02					
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01					
Op. Escavadeira	01	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>				
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00					
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02					
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01					
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02					
Pedreiro	01							
Servente	07							
Topógrafo	02							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>					

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 5º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	05	06	07	08	09	10	11
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)	Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 11 a 15 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.						
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01	Execução de reforço com envelopamento dos tubos na rede de esgoto da estaca 21 a 23 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.					
Aux. Topografia	01 Motoniveladora	01						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	01						
Encarregado	01 Trator de Esteira	01						
Ficheiro	01 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	01						
Op. de Rolo	01 Compactador Liso Dinapac	01						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>					
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	01 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	01							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>08</b>					

**Figura 01.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 08 a 10 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.

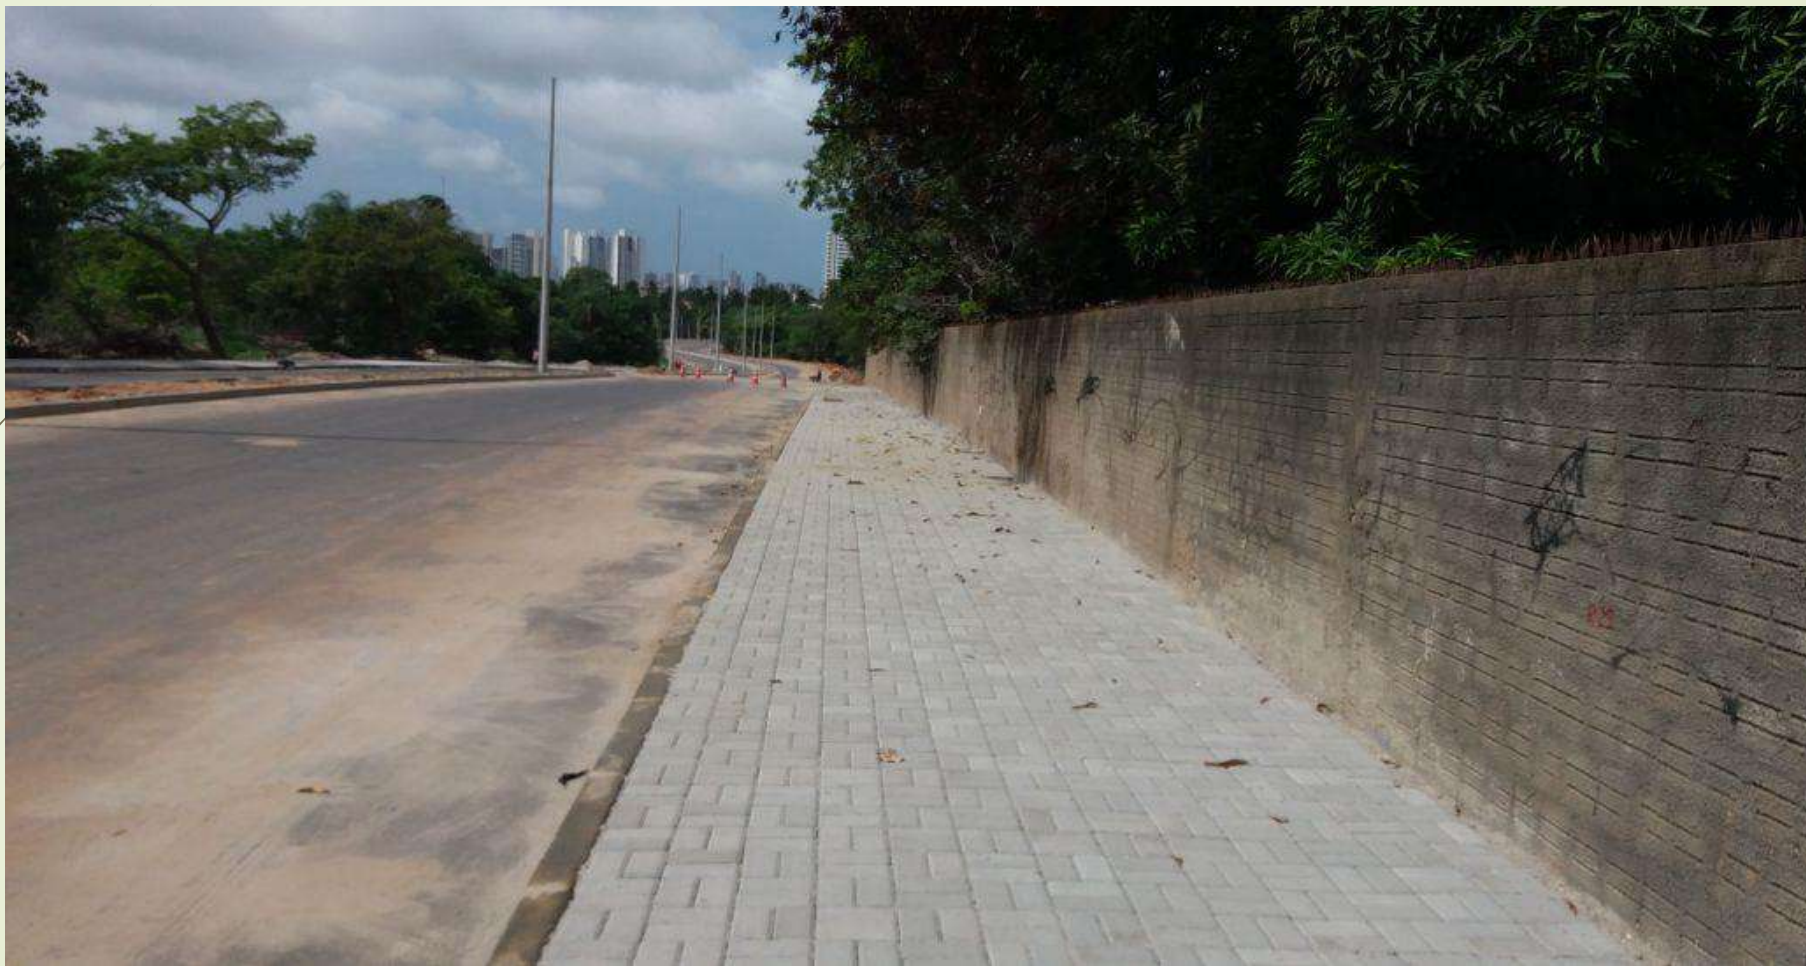

**Figura 01.**

**Figura 02.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 06 a 09 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 02.**

**Figura 03.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 12 a 14 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 03.**

**Figura 04.** Conclusão do meio-fio do lado direito da Rua Laranjal.



**Figura 04.**



**Figura 05.** Conclusão do meio-fio do lado esquerdo da Rua Maria Alice Ferraz.



**Figura 05.**

**Figura 06.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 11 a 15 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 06.**

**Figura 07 e 08.** Execução de reforço com envelopamento dos tubos na rede de esgoto da estaca 21 a 23 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 07.**



**Figura 08.**



# Sítio Tunga

## Avenida Léa Pompeu

### Resumo fotográfico dos serviços

#### **SEMANA 20: 15/02 A 23/02/2018**

- ❖ Diário de Obra, (slide 02 ao 06).
- ❖ Execução da laje de concreto no trecho onde foi feito o reforço com envelopamento dos tubos na rede de esgoto da estaca 21 a 23 do lado direito da Avenida Léa Pompeu, (slide 07).
- ❖ Assentamento das tampas nos poços de visita da rede de esgoto da Cagece na Avenida Léa Pompeu, (slide 08).
- ❖ Execução de meio-fio na Rua Projetada 02, (slide 09).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da Via Local, (slide 10).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 04 a 01 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu, (slide 11).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 15 a 29 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu, (slide 12).
- ❖ Recuperação devido às chuvas da calçada da estaca 10 a 12 do lado direito da Avenida Léa Pompeu, (slide 13).

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 1º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		19	20	21	22	23	24	25
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 15 a 23 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 12 a 14 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01	Recuperação da calçada da estaca 10 a 12 do lado direito da Avenida Léa Pompeu						
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	01							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	01									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>04</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA

3

## SEMANA 19: 2º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		19	20	21	22	23	24	25
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 23 a 26 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01	Assentamento das tampas nos poços de visita da rede de esgoto da Cagece na Avenida Léa Pompeu.						
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	00							
Motorista	00	Pipa	00							
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	01									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>17</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>02</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 3º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/2018			
				seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017			19	20	21	22	23	24	25
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70			Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 26 a 28 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu. Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 04 a 02do lado direito da Avenida Léa Pompeu.  <b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00							
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	02							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	01	Pálio	00							
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02							
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02							
Pedreiro	01									
Servente	07									
Topógrafo	02									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 4º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		19	20	21	22	23	24	25
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de blocos Intertravados na calçada do lado esquerdo da Via Local						
(Conforme necessidade)		(Conforme necessidade)		Execução de meio-fio na Rua Projetada 02						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00							
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	02							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	01	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02							
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02							
Pedreiro	01									
Servente	07									
Topógrafo	02									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>							



# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 19: 5º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		19	20	21	22	23	24	25
				Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b>		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 28 a 29 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.						
<b>(Conforme necessidade)</b>		<b>(Conforme necessidade)</b>		Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 01 a 02 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	01							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	01							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	01									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>08</b>							

**Figura 01.** Execução da laje de concreto no trecho onde foi feito o reforço com envelopamento dos tubos na rede de esgoto da estaca 21 a 23 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 01.**

**Figura 02 e 03.** Assentamento das tampas nos poços de visita da rede de esgoto da Cagece na Avenida Léa Pompeu.



**Figura 02.**



**Figura 03.**

**Figura 04 e 05.** Execução de meio-fio na Rua Projetada 02.

9



**Figura 04.**



**Figura 05.**

**Figura 06 e 07.** Execução de blocos Intertravados na calçada da Via Local.

10



**Figura 06.**




**Figura 07.**

**Figura 08 e 09.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 04 a 01 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 08.**

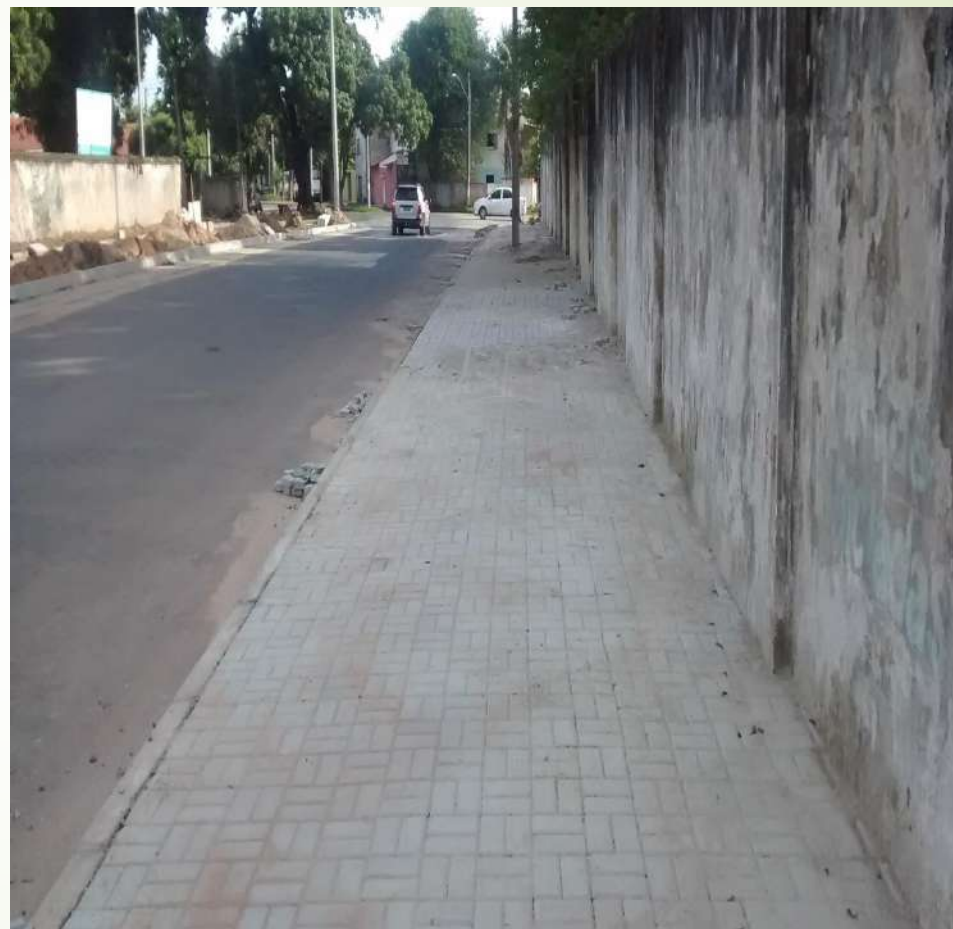

**Figura 09.**

**Figura 10 e 11.** Execução de blocos Intertravados na calçada da estaca 15 a 29 do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 10.**



**Figura 11.**

**Figura 12 e 13.** Recuperação devido às chuvas da calçada da estaca 10 a 12 do lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 12.**



**Figura 13.**





# Sítio Tunga

## Avenida Léa Pompeu

### Resumo fotográfico dos serviços

#### SEMANA 21: 26/02 A 02/03/2018

- ❖ Diário de Obra, (slide 02 ao 06).
- ❖ Execução de meio-fio rejuntamento e sarjeta em ambos os lados da Rua projetada 02, (slide 07).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da Rua Laranjal no lado direito da Avenida Léa Pompeu, (slide 08).
- ❖ . Limpeza da boca de lobo e compactando o solo para receber blocos intertravados na calçada da Avenida Léa Pompeu com Maria Alice Ferraz, (slide 09).
- ❖ Execução de blocos Intertravados na calçada da Rua Laranjal no lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu, (slide 10).
- ❖ Cagece abrindo um furo no asfalto da Rua Laranjal no lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu para instalação de um poço de visita, (slide 11).

# 1. DIÁRIO DE OBRA

2

## SEMANA 21: 1º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/MARÇO 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	26	27	28	01	02	03	04
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>		<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)	Execução de meio-fio rejuntamento e sarjeta em ambos os lados da Rua projetada 02.						
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	01 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	01 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	01						
Op. de Rolo	01 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00						
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	01 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	01							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>04</b>					

**MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEICULOS**

# 1. DIÁRIO DE OBRA

3

## SEMANA 21: 2º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/MARÇO 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	26	27	28	01	02	03	04
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)	Execução de blocos Intertravados na calçada da Rua Laranjal no lado direito da Avenida Léa Pompeu						
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	01 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	01 Carro Manutenção	00						
Motorista	00 Pipa	00						
Op. de Rolo	00 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00						
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	01 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	01							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>17</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>02</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEICULOS</b>				

# 1. DIÁRIO DE OBRA

## SEMANA 21: 3º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			FEVEREIRO/MARÇO 2018			
				seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017			26	27	28	01	02	03	04
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70			Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)	<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)			Limpeza da boca de lobo e compactando o solo para receber blocos intertravados na calçada da Avenida Léa Pompeu com Maria Alice Ferraz						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00							
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	02							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	01	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02							
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02							
Pedreiro	01									
Servente	07									
Topógrafo	02									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA

5

## SEMANA 21: 4º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 				MÊS:			FEVEREIRO/MARÇO 2018			
				seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		26	27	28	01	02	03	04
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>						
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)		Execução de blocos Intertravados na calçada da Rua Laranjal no lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu						
Administrativo	01	Caminhão Basculante	00							
Aux. Topografia	02	Motoniveladora	02							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01							
Encarregado	01	Trator de Esteira	01							
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	02							
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01							
Op. Escavadeira	01	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	02							
Op. Trator de Esteira	01	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	02	Trator de pneus	02							
Pedreiro	01									
Servente	07									
Topógrafo	02									
	00									
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>13</b>							

# 1. DIÁRIO DE OBRA

6

## SEMANA 21: 5º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			FEVEREIRO/MARÇO 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	26	27	28	01	02	03	04
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA</b>				<b>REGISTROS E COMENTÁRIOS</b>				
<b>EFETIVO DE OBRA:</b> (Conforme necessidade)		<b>INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b> (Conforme necessidade)		Cagece abrindo um furo no asfalto da Rua Laranjal no lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu para instalação de um poço de visita				
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01					
Aux. Topografia	01	Motoniveladora	01					
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	01					
Encarregado	01	Trator de Esteira	01					
Ficheiro	01	Carro Manutenção	01					
Motorista	00	Pipa	01					
Op. de Rolo	01	Compactador Liso Dinapac	01					
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	<b>MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS</b>				
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00					
Op. Patrol	01	Rolo pé carneiro	00					
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01					
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00					
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	01							
	00							
<b>TOTAL EFETIVO:</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:</b>	<b>08</b>					

**Figura 01 e 02.** Execução de meio-fio rejuntamento e sarjeta em ambos os lados da Rua projetada 02.



**Figura 01.**



**Figura 02.**

**Figura 03.** Execução de blocos Intertravados na calçada da Rua Laranjal no lado direito da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 03.**



**Figura 04.** Limpeza da boca de lobo e compactando o solo para receber blocos intertravados na calçada da Avenida Léa Pompeu com Maria Alice Ferraz.



**Figura 04.**

**Figura 05 e 06.** Execução de blocos Intertravados na calçada da Rua Laranjal no lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



**Figura 05.**



**Figura 06.**

**Figura 05 e 06.** Cagece abrindo um furo no asfalto da Rua Laranjal no lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu para instalação de um poço de visita.



**Figura 05.**



**Figura 06.**
