



Sítio Tunga

Avenida Léa Pompeu

Resumo fotográfico dos serviços

SEMANA 26 E 27: DE 02 A 06/04, E 09 A 13/04/2018

- ❖ Diário de Obra, (slide 02 ao 11).
- ❖ Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Rua Laranjal do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu para aplicação de piso tátil, (slide 12).
- ❖ Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Rua Laranjal do lado direito da Avenida Léa Pompeu para aplicação de piso tátil , (slide 13).
- ❖ Execução e conclusão de blocos Intertravados da Via Local, (slide 14).
- ❖ Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Via Local para aplicação de piso tátil, (slide 15)
- ❖ Execução e conclusão de piso tátil no eixo da calçada do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu, (slide 16).
- ❖ Execução e conclusão de piso tátil no eixo das calçadas da Via Local , (slide17).
- ❖ Execução e conclusão de piso tátil de mudança de direção nas calçadas Via Local, (slide 18).
- ❖ Execução e conclusão de piso tátil de mudança de direção nas calçadas da Avenida Léa Pompeu, (slide 19).
- ❖ Execução de meio-fio e calçada em concreto na Rua Projetada 02, (slide 20).
- ❖ Limpeza e pintura dos meio-fio na Avenida Léa Pompeu, (slide 21).

1. DIÁRIO DE OBRA

2

SEMANA 26: 1º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			ABRIL 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	02	03	04	05	06	07	08
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA		REGISTROS E COMENTÁRIOS						
EFETIVO DE OBRA: (Conforme necessidade)	INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS: (Conforme necessidade)	Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Rua Laranjal do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu para aplicação de piso tátil.						
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	00 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	00 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	00						
Op. de Rolo	00 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00						
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	00 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	00							
	00							
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03					

MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS

1. DIÁRIO DE OBRA

3

SEMANA 26: 2º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			ABRIL 2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		02	03	04	05	06	07	08
				Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS						
EFETIVO DE OBRA:		INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:		Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Rua Laranjal do lado direito da Avenida Léa Pompeu para aplicação de piso tátil.						
(Conforme necessidade)		(Conforme necessidade)								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	00	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	00	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	00							
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00							
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	00	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	00									
	00									
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03							

MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS

1. DIÁRIO DE OBRA


4

SEMANA 26: 3º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			ABRIL 2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		02	03	04	05	06	07	08
				Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS						
EFETIVO DE OBRA:		INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:		Execução e conclusão de blocos Intertravados da Via Local.						
(Conforme necessidade)		(Conforme necessidade)								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	00	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	00	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	00							
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	00	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	00									
	00									
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03							

1. DIÁRIO DE OBRA

SEMANA 26: 4º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			ABRIL 2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		02	03	04	05	06	07	08
				Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS						
EFETIVO DE OBRA:		INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:		Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Via Local para aplicação de piso tátil.						
(Conforme necessidade)		(Conforme necessidade)								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	00	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	00	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	00							
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00							
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	00	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	00									
	00									
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03							

MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS

1. DIÁRIO DE OBRA

SEMANA 26: 5º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			ABRIL 2018			
Site: Implantação Av Léa Pompeu		Início das Atividades: 02/10/2017		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.		Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70		02	03	04	05	06	07	08
				Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS						
EFETIVO DE OBRA:		INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:		Execução e conclusão de piso tátil no eixo da calçada do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.						
(Conforme necessidade)		(Conforme necessidade)								
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	00	Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01	Trator de Esteira	00							
Ficheiro	00	Carro Manutenção	01							
Motorista	00	Pipa	00							
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS						
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	00	Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00							
Pedreiro	01									
Servente	10									
Topógrafo	00									
	00									
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03							

1. DIÁRIO DE OBRA

7

SEMANA 27: 1º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA		MÊS:			ABRIL 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	09	10	11	12	13	14	15
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS				
EFETIVO DE OBRA: (Conforme necessidade)	INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS: (Conforme necessidade)	Execução e conclusão de piso tátil no eixo das calçadas da Via Local.						
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	00 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	00 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	00						
Op. de Rolo	00 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00						
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	00 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	00							
	00							
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03					

MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS

1. DIÁRIO DE OBRA

SEMANA 27: 2º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			ABRIL 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	09	10	11	12	13	14	15
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS				
EFETIVO DE OBRA:	INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	Execução e conclusão de piso tátil de mudança de direção nas calçadas Via Local.						
(Conforme necessidade)	(Conforme necessidade)							
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	00 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	00 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	00						
Op. de Rolo	00 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00	MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS					
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	00 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	00							
	00							
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03					

1. DIÁRIO DE OBRA

SEMANA 27: 3º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			ABRIL 2018		
				seg	ter	qua	qui	sex	sáb
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	09	10	11	12	13	14	15	
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14				
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS					
EFETIVO DE OBRA:	INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	Execução e conclusão de piso tátil de mudança de direção nas calçadas da Avenida Léa Pompeu.							
(Conforme necessidade)	(Conforme necessidade)								
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01							
Aux. Topografia	00 Motoniveladora	00							
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00							
Encarregado	01 Trator de Esteira	00							
Ficheiro	00 Carro Manutenção	01							
Motorista	00 Pipa	00							
Op. de Rolo	00 Compactador Liso Dinapac	00							
Op. Escavadeira	00 Pálio	00	MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS						
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00							
Op. Patrol	00 Rolo pé carneiro	00							
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01							
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00							
Pedreiro	01								
Servente	10								
Topógrafo	00								
	00								
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03						

1. DIÁRIO DE OBRA

SEMANA 27: 4º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA 		MÊS:			ABRIL 2018			
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	09	10	11	12	13	14	15
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14			
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA		REGISTROS E COMENTÁRIOS						
EFETIVO DE OBRA:	INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	Execução de meio-fio e calçada em concreto na Rua Projetada 02.						
(Conforme necessidade)	(Conforme necessidade)							
Administrativo	01 Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	00 Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00 Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01 Trator de Esteira	00						
Ficheiro	00 Carro Manutenção	01						
Motorista	00 Pipa	00						
Op. de Rolo	00 Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00 Pálio	00	MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS					
Op. Moto Serra	00 Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	00 Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00 S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00 Trator de pneus	00						
Pedreiro	01							
Servente	10							
Topógrafo	00							
	00							
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03					

1. DIÁRIO DE OBRA

11

SEMANA 27: 5º dia de trabalho no Sítio Tunga

DIÁRIO DE OBRA				MÊS:			ABRIL 2018		
				seg	ter	qua	qui	sex	sáb
Site: Implantação Av Léa Pompeu	Início das Atividades: 02/10/2017	09	10	11	12	13	14	15	
Escopo: - Terrap., Pav. e Dren.	Prazo para Conclusão da Obra (dias): 70	Nº			14				
REGISTROS E COMENTÁRIOS DA CONTRATADA				REGISTROS E COMENTÁRIOS					
EFETIVO DE OBRA:		INVENTÁRIO DE VIATURAS/EQUIPAMENTOS:		Limpeza e pintura dos meio-fio na Avenida Léa Pompeu.					
(Conforme necessidade)		(Conforme necessidade)							
Administrativo	01	Caminhão Basculante	01						
Aux. Topografia	00	Motoniveladora	00						
Enc. Manutenção	00	Escavadeira Hidráulica	00						
Encarregado	01	Trator de Esteira	00						
Ficheiro	00	Carro Manutenção	01						
Motorista	00	Pipa	00						
Op. de Rolo	00	Compactador Liso Dinapac	00						
Op. Escavadeira	00	Pálio	00	MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS / VEÍCULOS					
Op. Moto Serra	00	Retro escavadeira	00						
Op. Patrol	00	Rolo pé carneiro	00						
Op. Trator de Esteira	00	S-10	01						
Op. Trator de Pneus	00	Trator de pneus	00						
Pedreiro	01								
Servente	10								
Topógrafo	00								
	00								
TOTAL EFETIVO:	13	TOTAL VIATURAS/EQUIPAMENTOS:	03						

Figura 01 e 02. Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Rua Laranjal do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu para aplicação de piso tátil.



Figura 01.



Figura 02.

Figura 03 e 04. Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Rua Laranjal do lado direito da Avenida Léa Pompeu para aplicação de piso tátil.



Figura 03.



Figura 04.

Figura 05 e 06. Execução e conclusão de blocos Intertravados da Via Local.



Figura 05.



Figura 06.

Figura 07 e 08. Execução de retirada dos blocos no eixo das calçadas na Via Local para aplicação de piso tátil.



Figura 07.



Figura 08.

Figura 09 e 10. Execução e conclusão de piso tátil no eixo da calçada do lado esquerdo da Avenida Léa Pompeu.



Figura 09.



Figura 10.

Figura 11 e 12. Execução e conclusão de piso tátil no eixo das calçadas da Via Local.



Figura 11.



Figura 12.

Figura 13. Execução e conclusão de piso tátil de mudança de direção nas calçadas Via Local.



Figura 13.

Figura 14,15 e 16. Execução e conclusão de piso tátil de mudança de direção nas calçadas da Avenida Léa Pompeu.



Figura 14.



Figura 15.



Figura 16.

Figura 17 e 18. Execução de meio-fio e calçada em concreto na Rua Projetada 02.



Figura 17.



Figura 18.

Figura 19,20 e 21. Limpeza e pintura dos meio-fio na Avenida Léa Pompeu.

21



Figura 19.



Figura 20.

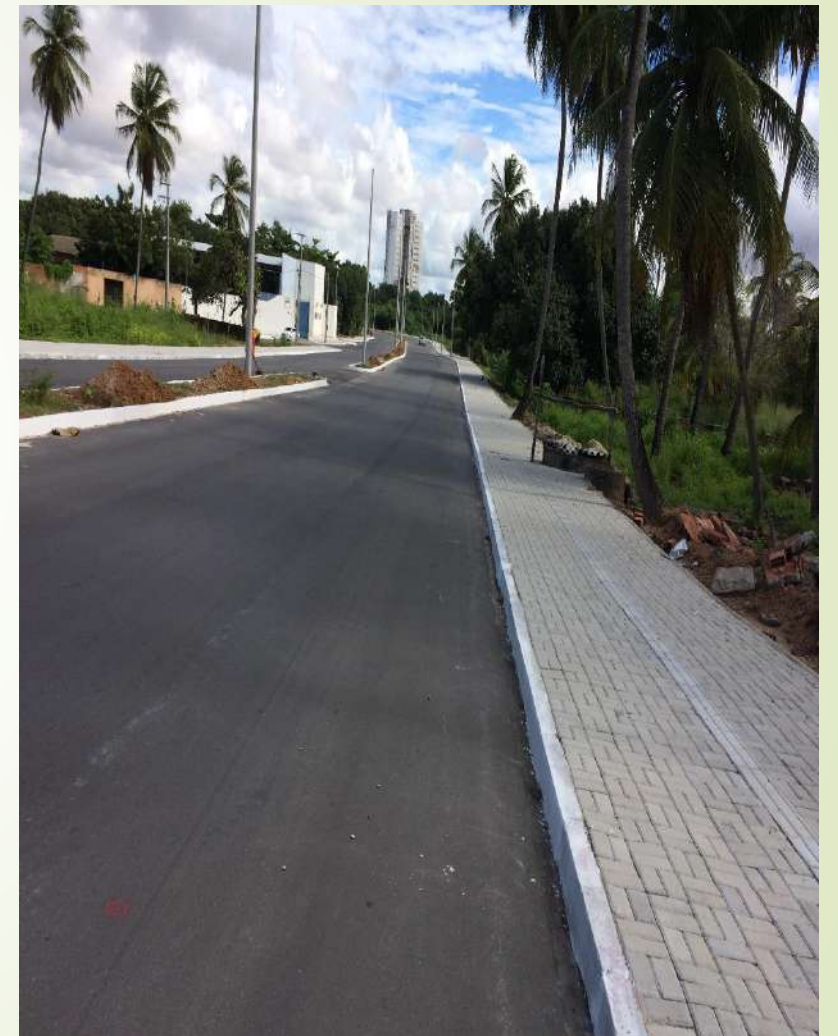


Figura 21.
