

# PROJETO RUAS COMPLETAS – FORTALEZA

## Rua Dr. João Moreira



Lançamento da Rede Nacional de Mobilidade de Baixo Carbono  
**Niterói - RJ**  
**Abr/2017**

1



I Encontro da Rede Nacional de Mobilidade de Baixo Carbono  
**Recife - PE**  
**Nov/2017**

3



II Encontro da Rede Nacional de Mobilidade de Baixo Carbono  
**Niterói - RJ**  
**Mai/2018**


5

Oficina Local do Projeto Ruas Completas  
**Fortaleza - CE**  
**Jun/2017**




2

Elaboração do Projeto básico – Rua João Moreira  
Responsável: SEUMA, SEINF e SCSP  
**Jan a maio/2018**

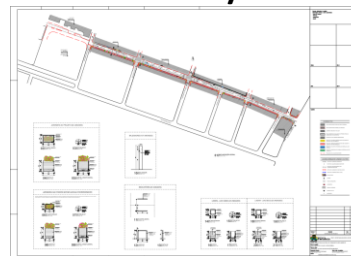

4


Projeto Executivo e Orçamento inicial  
Responsável: SEINF  
**Mai a agosto/2018**

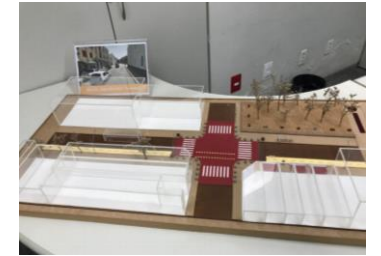

6

# PROJETO RUAS COMPLETAS – FORTALEZA

## Rua Dr. João Moreira

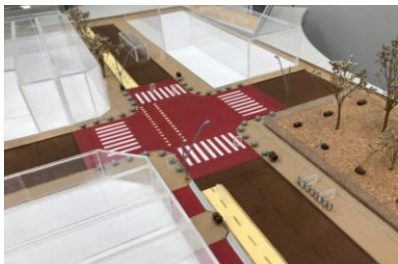

Revisão e adaptação do Projeto  
Executivo e Orçamento final  
Responsável: SEUMA e SEINF  
**Julho/2019**



Workshop do Projeto Ruas  
Completas  
*São Paulo - SP*  
**28 de agosto de 2019**



**FASE 2:** Execução da obra  
Previsão segundo semestre 2020  
Responsável: SOP

7

8

9

10

11

12

Seminário Transformações Urbanas  
*São Paulo - SP*  
**27 de agosto de 2019**



**FASE 1:** Execução da obra  
set/2019 a jan/2020  
Responsável: SEINF



**FASE 3:** Execução da obra  
Previsão segundo semestre 2020  
Responsável: SCSP e AMC

